

【現状】(令和8年3月末時点)

- 災害廃棄物等の処理見込量:約 2.3万 t
- 解体対象建物:66 棟
(住家:18 棟、非住家:33 棟、所有者不明:15 棟)

災害廃棄物等の種類別処理済量(集積量)、発生量

廃棄物の種類	処理済量(集積量)	発生量合計
災害廃棄物等		
片付けごみ、解体廃棄物、がれき混じり土砂(仮置場表層土)	700t (1,700t)	6,500t
木くず(枝葉等)	0t (3,500t)	7,100t
倒木*	0t (1,900t)	9,300t
合計	700t (7,100t)	22,900t

*倒木のうち支庁管理分は補助対象外

【実行計画策定の目的】

災害廃棄物等を生活環境の保全等に配慮しつつ、適切かつ円滑、迅速な処理を進めるために必要な事項を整理

【災害廃棄物処理等の処理方針】

- 第一 優先度の高いものから迅速に災害廃棄物等の処理を進める。
- 第二 災害廃棄物等は、できる限り島内で処理を行う。島内で処理を行うことが困難な災害廃棄物等は、島内で前処理を行った上で、島外でその後の処理を行う。
- 第三 災害廃棄物等の分別を徹底し、埋立処分量の削減及び再資源化に努める。
- 第四 島内で行う災害廃棄物等の処理は、島内の事業者へ委託して行う。
- 第五 災害廃棄物の島外への運搬は、八丈島と東京港との間に定期航路を定めている海運業者に委託し船舶により行う。
- 第六 災害廃棄物等の処理に係る経費の削減に努める。
- 第七 災害廃棄物等の処理に当たっては、環境省、東京都及び区市町村等に協力を要請する。

(令和7年11月13日八丈町公表)


【改定のポイント】

- 令和8年2月末時点の災害廃棄物等の搬入量及び処理量に基づき発生量を見直し
- 現場選別により、がれき混じり土砂の削減
- 処理進捗に伴う全体工程表の見直し

【仮置場等の位置図】(数量は令和8年2月末時点)



【災害廃棄物等の処理フロー】

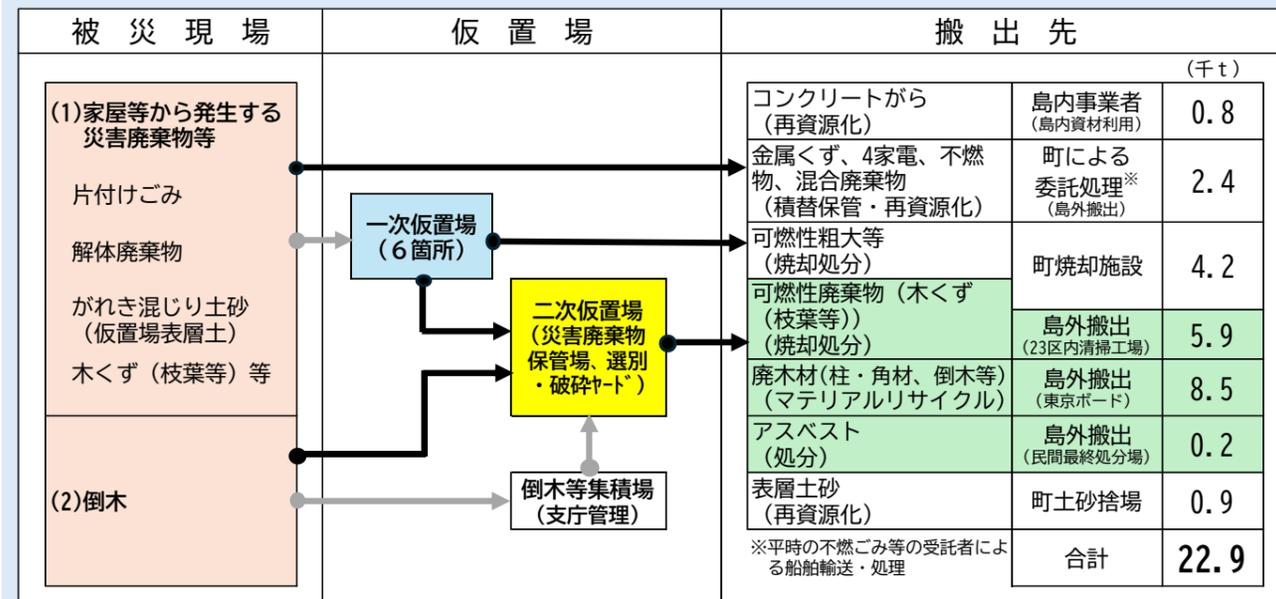

【全体工程表】

工程	令和7年度						令和8年度												
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
町災害廃棄物処理実行計画				◎第1版		◎第2版													
片付けごみ等における町民等による持込																			
一次仮置場	解体廃棄物	①南原スポーツ公園災害廃棄物仮置場(R8.6頃から保管場として利用)	運営	搬出															
		二次仮置場(災害廃棄物保管場)に転用																	
		②大賀郷仮置場	運営																
	枝葉・倒木類	③三根仮置場	運営																
		④榎立仮置場	運営	搬出	原状復旧														
		⑤中之郷仮置場	運営	搬出	原状復旧														
⑥末吉仮置場	運営	搬出	原状復旧																
二次仮置場の整備、運営(南原スポーツ公園)	災害廃棄物保管場																		
	倒木等の選別破砕ヤード(公園隣接地)																		
島内処理	片付けごみ等(可燃性粗大、金属くず、家電4品目、不燃物、混合廃棄物等)																		
	①八丈町クリーンセンター ②浅沼組砕石再生プラント																		
町による委託処理	片付けごみ等(可燃性粗大、金属くず、家電4品目、不燃物、混合廃棄物等)																		
	②八丈町南原処理場(有明興業八丈島営業所)																		
島外処理	廃木材、可燃性廃棄物(木くず等)																		
	(公財)東京都環境公社へ包括委託(23区内の清掃工場・民間リサイクル施設)																		
その他(倒木等集積場(支庁管理))※補助対象外																			

一次仮置場の一部閉鎖
令和8年1月末

二次仮置場の運営開始
令和8年6月

処理完了
令和8年12月末

二次仮置場の原状復旧
令和9年1月以降

R7.12 特別区長会・都・町で合意書、都・東京都環境公社・町で協定書を締結

島外処理 R8.1開始~R8.12(予定)

【処理の進捗状況】

(令和8年3月現在)

- ・災害廃棄物等の発生推計量の約 22,900tに対して、仮置場への集積量・処理済量:約 7,800t(約 30%)うち処理済量:約 700t(約 3%)
- ・現在、本格的な処理の開始に向けて二次仮置場の用地選定・測量・設計を完了し、R8.4月から整備、R8.6から運営を予定
- ・今後、公費解体に着手して、R8.12までに撤去・処理完了を目指す
